

ก.ค.ฉิว4เลนเชื่อมสะพานไทย-กัมพูชา

- 6กม.90%/19กม.70%เร็วทะลุเป้า
- รับผิดชอบ'บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบัท'

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบัท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 (สายสุพรรณบุรี-อรัญประเทศ) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ที่แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ช่วง กม.0+000-25+211 จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และสิ้นสุดที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ระยะทาง 25.211 กม. งบฯ 1,900,030,700 บาท ในเรื่องแรงงานบ้างเล็กน้อย เนื่องจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ ทำให้ต้องใช้แรงงานในปัจจุบัน ทล.ได้บริหารงานให้เหมาะสมและแก้ไขสถานการณ์ทำงานให้ได้ตามแผนมากที่สุด


ขณะนี้งานเดินหน้าไปมาก สำหรับตอน 1 ช่วง กม.0+000-10+500 ระยะทาง 10.500 กม. งบฯ 1,007,157,900 บาท คืบหน้า 69.577% จากแผนงาน 52.783% เร็วกว่าแผน 16.794% และตอนที่

2 ช่วง กม.10+500-25+211 ระยะทาง 14.711 กม. งบฯ 892,872,800 บาท คืบหน้า 70.373% จากแผนงานอยู่ที่ 48.790% เร็วกว่าแผน 21.583% ทั้ง 2 ตอน อยู่ระหว่างก่อสร้างถนนปูผิวคอนกรีตขนาด 4 ช่องไปกลับ รวมทั้งสร้างสะพานข้ามลำน้ำ 5 แห่ง ขณะเดียวกันช่วงนี้มีฝนตกชุก ฝนมากก่อนฤดูปกติ ทำให้ปัญหาเข้าหน้างานลำบาก เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานปูผิวจราจร อย่างไรก็ตาม สำหรับถนนช่วงต้น-กลางโครงการ ประมาณ 19 กม. จะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนเม.ย. 65

สำหรับตอนที่ 2 ช่วงปลายโครงการอีก 6 กม. พื้นที่ อ.อรัญประเทศ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบัท) จะเร่งรัดก่อสร้างให้เสร็จก่อนตอนนี้มีความคืบหน้า 90% แล้ว ปูผิวจราจรให้แล้วเสร็จและตีเส้นจราจรแบ่งช่องจราจร รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ รวมทั้งไฟส่องสว่าง คาดว่าจะเสร็จช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ ตามแผนที่วางไว้เพื่อให้ถนนนี้เชื่อมกับสะพาน

มิตรภาพที่สร้างเสร็จแล้ว ตามนโยบายภาครัฐที่มีแผนเปิดใช้ด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชั่วคราวก่อน เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและลดปัญหาความแออัดจุดผ่าน

แดนถาวรบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ โดยกรมศุลกากร อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 65 จากนั้นจะเปิดบริการแบบสมบูรณ์ต่อไป

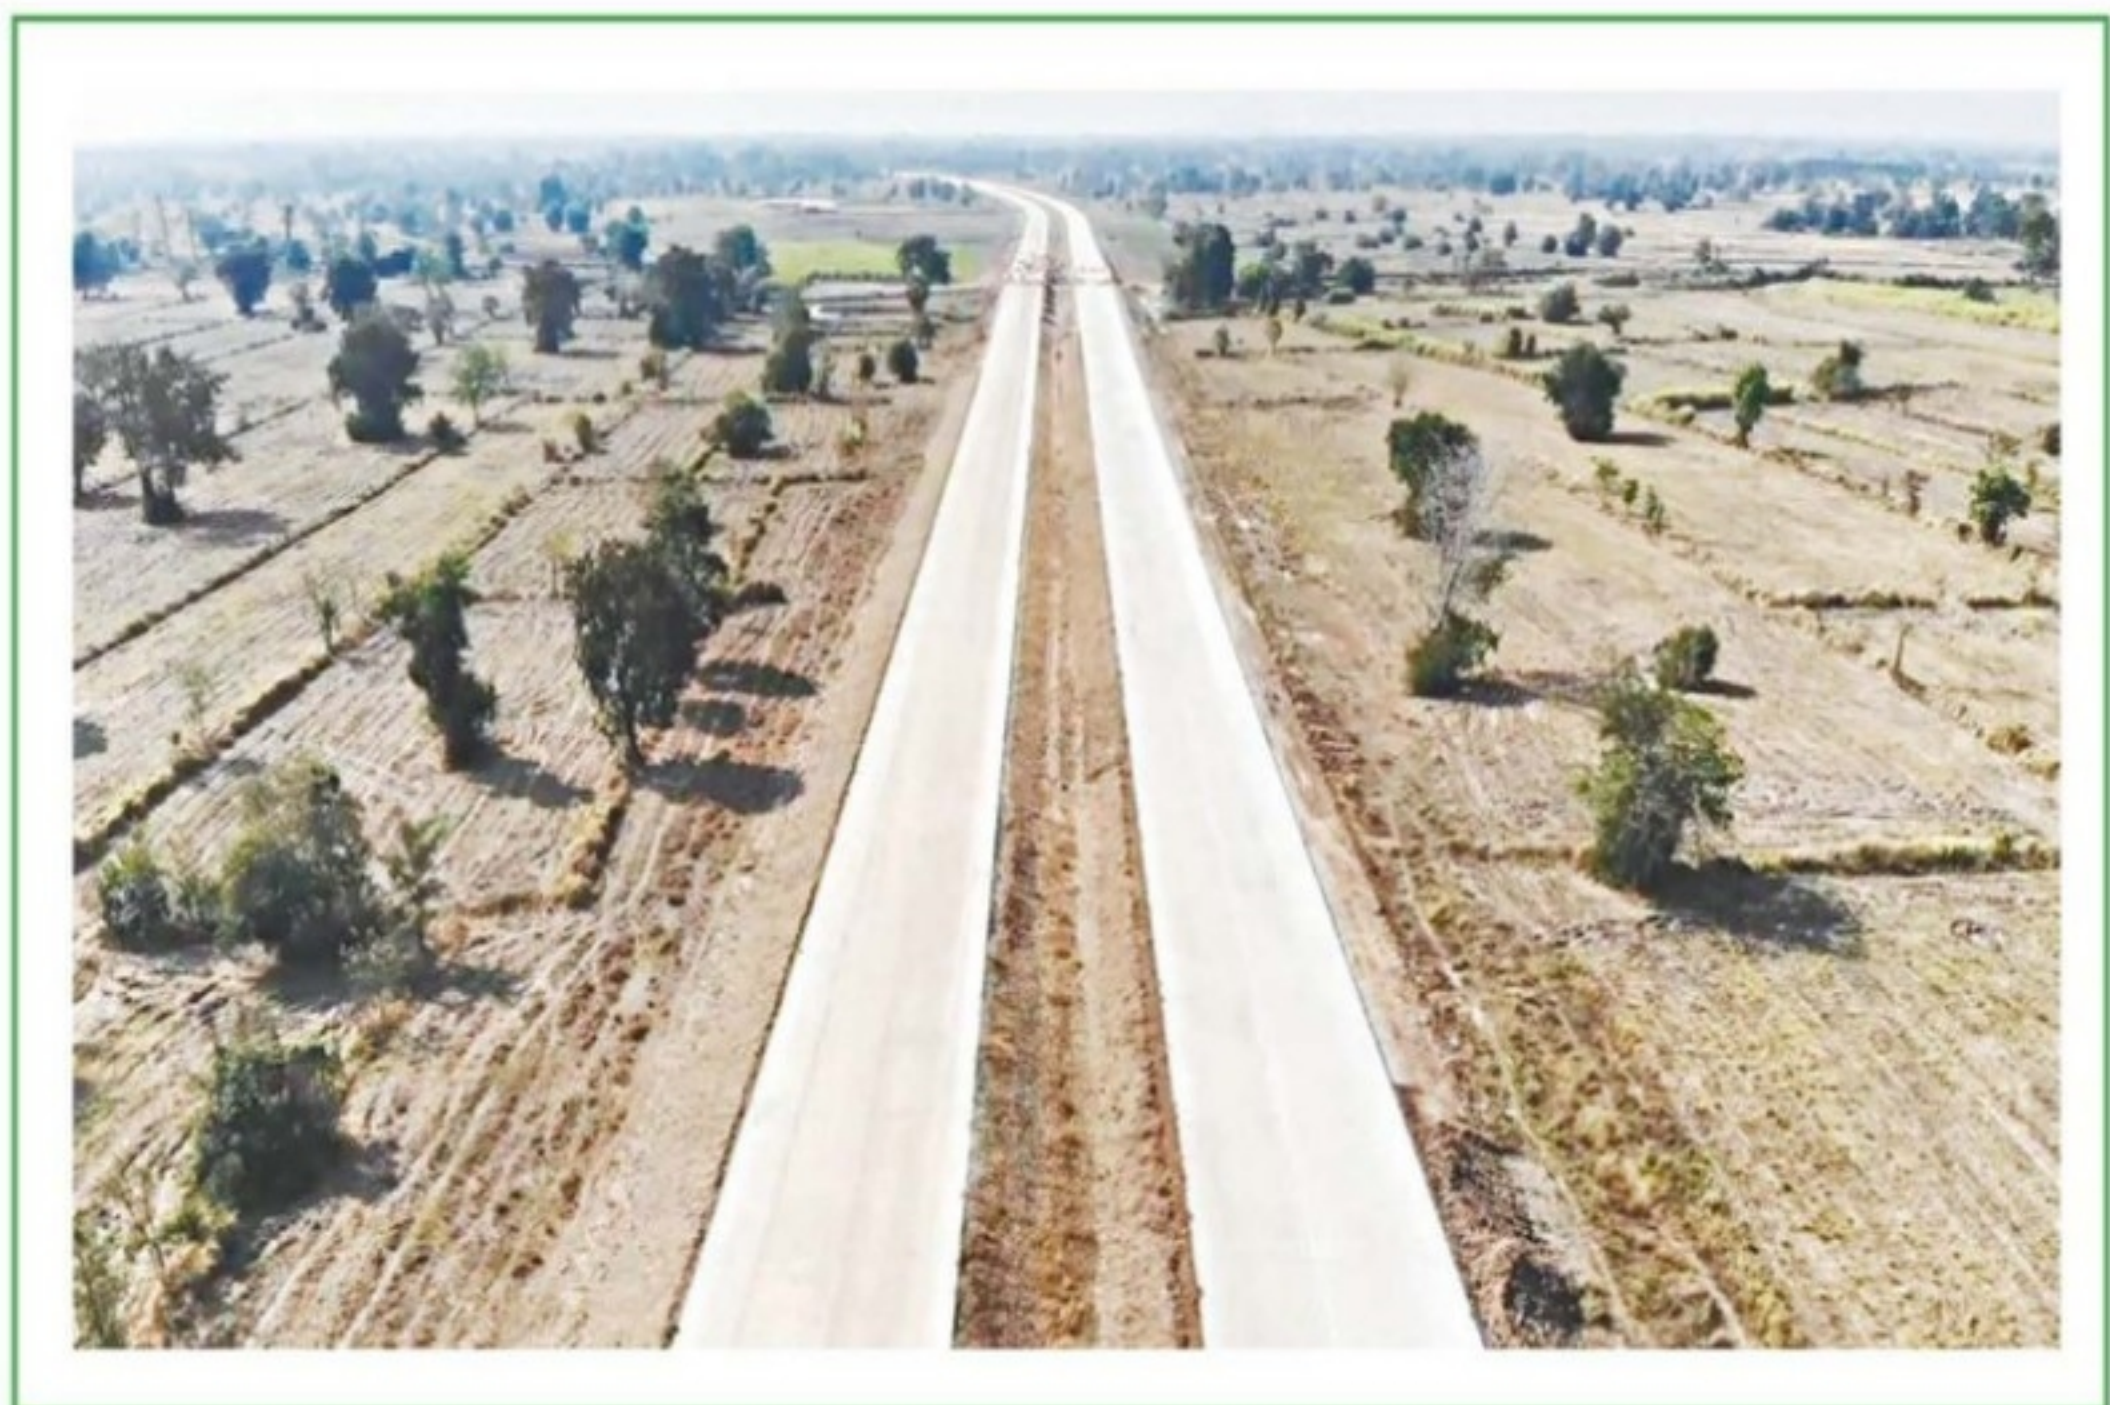

โครงการนี้เริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 7 เม.ย. 65 ใช้เวลา 1,080 วัน โดยมีบริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับจ้าง.
