




เสาตอม่อเส้นพหลฯขึ้นฟรีบ

●เลื่อนคืนผิวแยกรัชโยธิน25พ.ค.

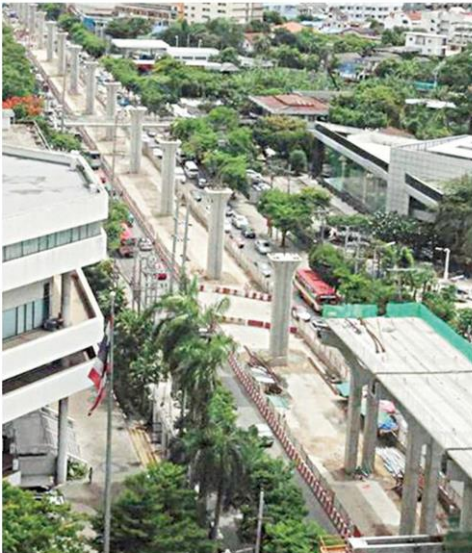

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ตามแนวเส้นทางถนนพหลโยธิน ว่า ขณะนี้สัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ งานเสร็จ 1 ใน 3 ของงานทั้งหมดแล้ว สร้างฐานรากแล้วเกือบ 90% และเริ่มติดตั้งทางวิ่งรถไฟฟ้าแล้วบริเวณคลองบางบัว รวมถึงติดตั้งชิ้นส่วนรองรับทางวิ่งบนชั้นฐานรากสถานีศรีปทุมแล้ว เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนเชื่อมถึงสถานีแล้วจะเคลื่อนอุปกรณ์ติดตั้งผ่านช่วงสถานีและจะติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งต่อเนื่องไปท่สถานีกรมป่าไม้ต่อไป

ส่วนการก่อสร้างกลางห้าแยกลาดพร้าว นั้น อยู่ในช่วงสร้างฐานราก จากนั้นจะตั้งเสาตอม่อรับรถไฟฟ้า คาดว่าภายในปลายปีจะเริ่มวางทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามทางยกระดับดอนเมืองหรือโถกแล้วก็ได้

สำหรับสัญญาที่ 2 กิจการร่วมค้า UN-SH-CH (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ, บริษัทชินโฮโดรฯ และบริษัท ไซเบอร์เบอร์ จากประเทศจีน) เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่-คูคต ดำเนินการไปแล้ว 80% วางเสารองรับทางวิ่งพร้อมทางรถไฟฟ้าแล้วในบางจุด เป็นไปตามแผนงาน ขณะนี้วางฐานรากเสาบริเวณหน้าไทยนิคมสงเคราะห์และภายในเดือนหน้าจะเริ่มก่อสร้างฐานรากเสาฝั่งสำนักงานเขตบางเขนเพื่อเตรียมรองรับทางวิ่งข้ามสะพานวงเวียนหลักสี่ต่อไป



สัญญาที่ 3 กิจการร่วมค้า STEC-AS-3 (บมจ.ซีโน-ไทยฯ กับบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ) เป็นผู้รับจ้างการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างพื้นอาคารและได้เตรียมการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าที่ศูนย์ซ่อมบำรุงส่วนการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร กม.25 และอาคารจอดแล้วจรถูกคอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตอกเสาเข็มแล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าจะภายในสิ้นปีตลอดทั้งโครงการจะมีเสาไฟฟ้าขึ้นครบตลอดแนวเส้นทาง

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า กำหนดการคืนพื้นผิวจราจรกลางแยกรัชโยธิน แต่เดิมในวันที่ 22 พ.ค. 60 เพื่อเปลี่ยนจากระบบวงเวียนมาเป็นสี่แยกและเลี้ยวขวาได้ทุกทิศทางนั้น ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้กระบวนการอัดหน้าดินบนอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก จึงต้องเลื่อนเป็นวันที่ 25 พ.ค.แทน และหากฝนยังตกต่อเนื่องอาจต้องเลื่อนคืนผิวจราจรไปเป็นสิ้นเดือน พ.ค.นี้
